


2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機																			




石炭貯蔵建屋
建屋鉄骨の建設が半分完成しました。建屋は2021年10月に完成予定です。



煙突
180mの煙突を支える4つの鉄骨の基礎と中心に2つの筒身を支える基礎が完成しました。

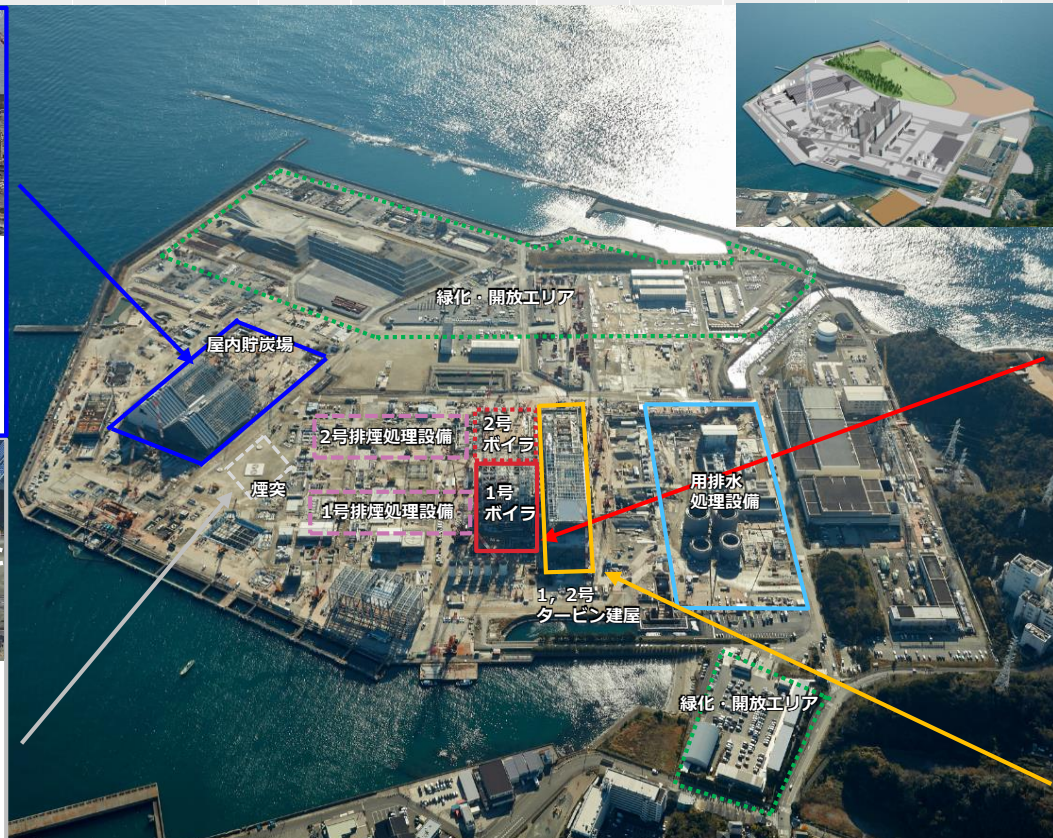

石炭バンカー
石炭をボイラに入れる前に一時的に貯留するタンクです。ボイラ1台あたりに6台設置します。



天井クレーン
タービン建屋天井に設置するクレーンです。110tの物を吊ることができ、タービンなど重量物の点検に使用します。

工事概要 基礎工事が終了したところから各建屋の内外装工事、機器据付を実施しています。
ボイラ 鉄骨高さが1/2まで完成し、燃焼のための空気ダクトや石炭を砕く微粉炭機を設置中です。
タービン 建屋の内外装工事を実施しています。天井クレーンの据付を開始します。
煙突 鉄骨の建設を開始します。
用排水処理 建屋の内外装工事、貯水タンク据付及びコンクリートで排水槽を構築しています。
屋内貯炭場 建屋の鉄骨・内外装工事及び建屋内コンベヤ据付を実施しています。

先月までの実績工事進捗率

1号工事進捗率 22.3%
 2号工事進捗率 4.4%
 総合工事進捗率 15.3%
