

ジェラ JERA横須賀ジャーナル

2021年10月号


2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機								▼100m ▼180m											
				煙突															



煙突
煙突が180mとなり完成時の高さに達しました。これからは航空障害灯等の付属設備を設置します。



石炭灰サイロ（貯蔵槽）
石炭灰を一時貯蔵し、セメントの材料としてリサイクルするため、ここから搬出します。

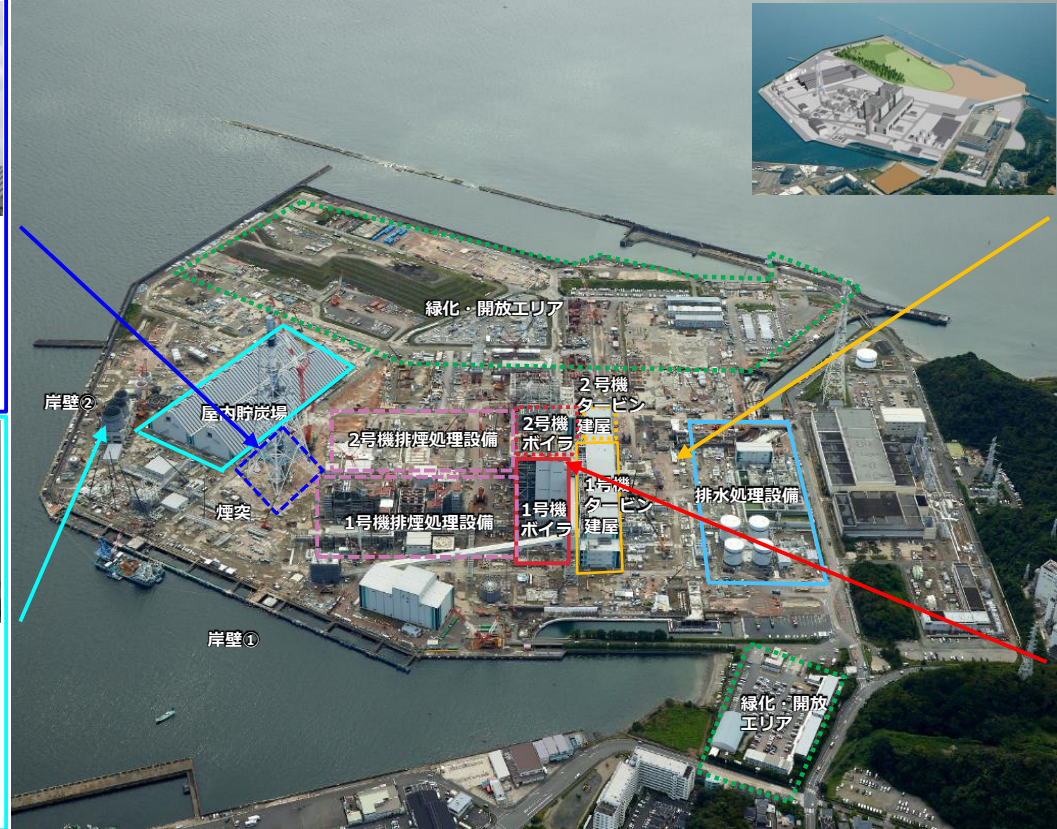

ケーブルドラム
275KV送電用ケーブル送電用ケーブルを地下トンネルに敷設しています。ケーブルの太さは14cmです。



石炭コンベヤ
1号-2号間を接続する石炭コンベヤの設置が完了しました。2号用の石炭は1号をって運炭されます。

工事概要

- ボイラ** 2号機のボイラを支える鉄骨が1号機と同じ高さになりました。
- タービン** 1号機復水器の蒸気を冷やす海水が通る11,900本の配管組込を開始しました。
- 環境設備** 1号機の排煙処理設備の組立を開始しました。
- 建物設備** タービンを据付する建屋が1号機から2号機まで、いよいよ完成しました。
- 屋内貯炭場** 建屋の屋根・外壁が完成しました。石炭を運ぶコンベヤの設置を開始しました。

先月までの実績工事進捗率

- 1号機工事進捗率 54.4%
- 2号機工事進捗率 23.5%
- 総合工事進捗率 42.2%
