

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機															
								100m▼ 180m▼ 据付完了▼											
				煙突															


※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



ハヤブサ用巣箱
地域に生息が確認されているハヤブサが営巣できるように巣箱を煙突2か所に設置しました。



1号機の小型発電設備の完成
ボイラーやタービンに、補助的に電気を供給する小型の発電設備が完成しました。

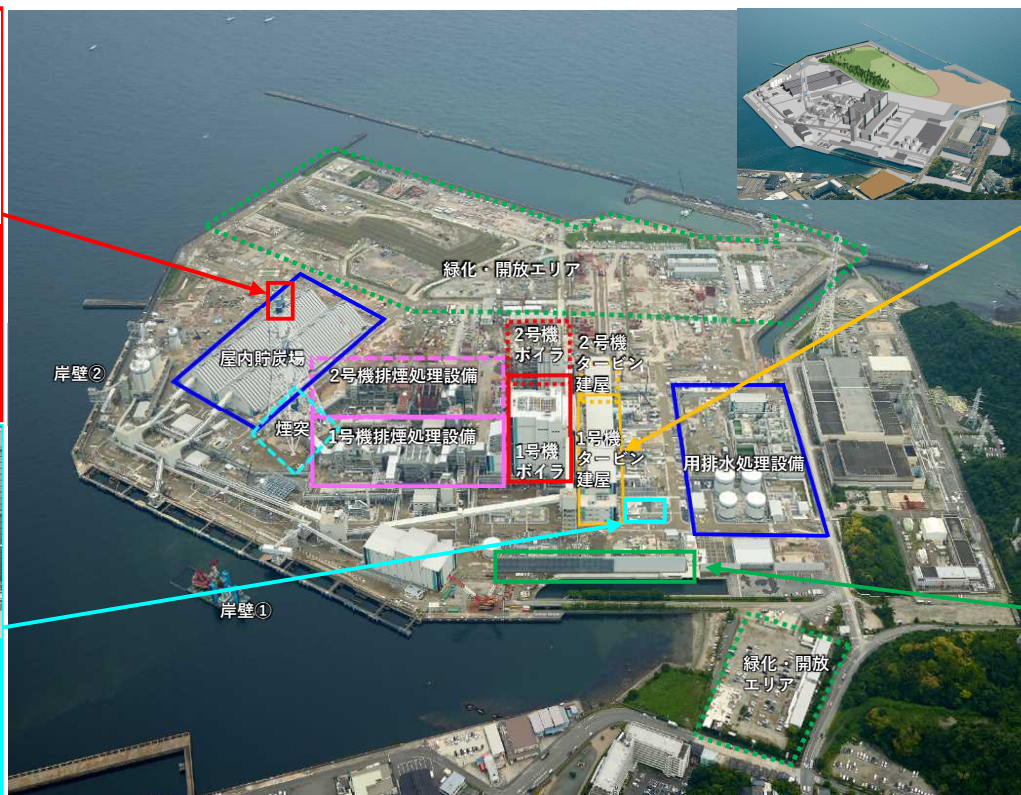

1号タービン建屋消防検査
1号タービン建屋の消防検査を受検し、消火設備などが万全であることを確認頂きました。



防音壁の設置
発電所の正面に設置された防音壁です。高さは18mあり、強風にも耐えられる強固なものです。

工事概要

ボイラ 1号微粉炭機（よく燃焼するように石炭を粉砕する設備）の試運転を開始しました。

タービン 1号蒸気タービンが関係設備を含めて据付工事が完了しました。

電気設備 1号発電機の据付工事が完了しました。

環境設備 1号電気集じん装置（燃焼ガス中の石炭灰を捕集、除去する設備）の試運転を開始しました。

共通設備 運炭（石炭を貯炭場からボイラに運ぶ）コンベヤの試運転を開始しました。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率 89.7 %

2号機工事進捗率 57.5 %

総合工事進捗率 77.0 %
