

ジェラ JERA横須賀ジャーナル

2022年8月号

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				煙突				100m▼ 180m▼ 掘付完了▼											


※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



用船の初着桟
横須賀火力での初着桟は石灰石を運ぶ船でした。石灰石は、燃烧ガス中の硫黄分除去に活用されます。



屋外消火栓設置状況確認
所轄消防が消火設備の設置状況を確認しました。円滑な消防活動が行えるよう体制を整えて参ります。

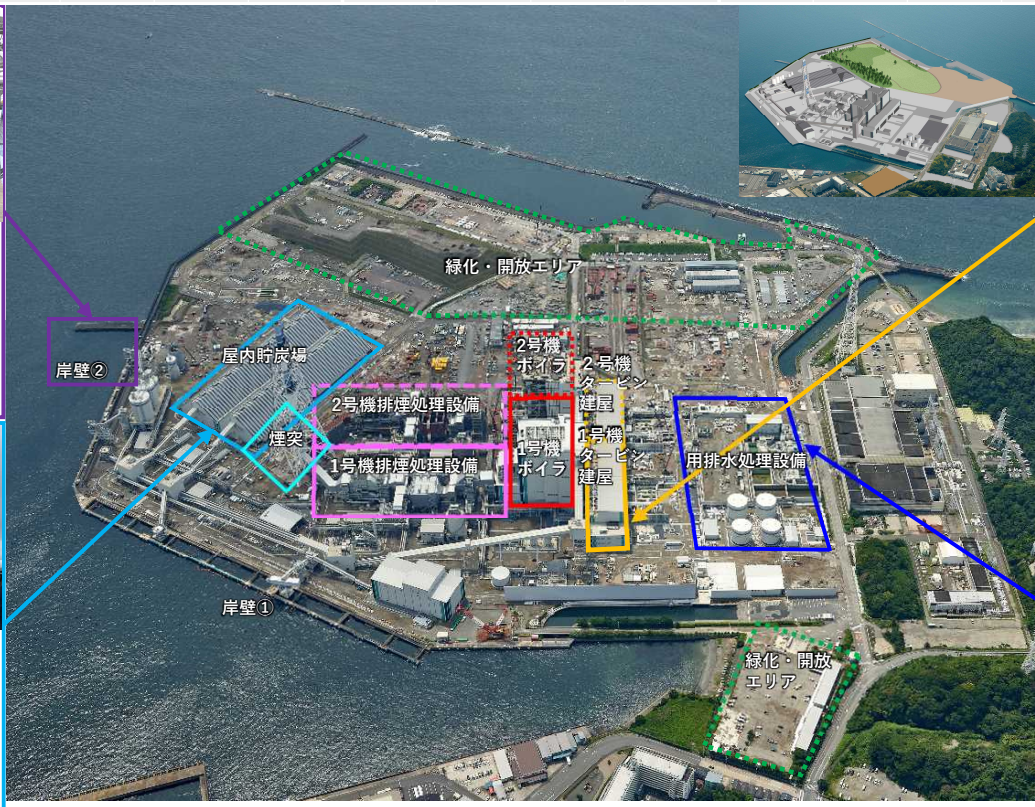

ボイラ安全装置確認
1号ボイラバーナの初点火に先立ち、ボイラの安全装置が正常に組み込まれていることを確認しました。



排水処理設備の照明完成
CO2排出量削減の観点から、LED照明を採用し設置しました。

工事概要

ボイラ 2号ボイラに水を供給するための配管や電動機等の設置工事を実施しております。

タービン 1号タービンを蒸気で回転させる前の準備として、タービンのたわみを防止するため電動機による低速回転を開始しました。

電気設備 仮設の設備で電気を通し、2号機における電動機等の確認作業が始まります。

共通設備 1,2号機で使用する高圧のガスポンペを安全に格納する建物が完成しました。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率 93.3 %

2号機工事進捗率 61.3 %

総合工事進捗率 80.7 %
