

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼															


※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



**1号ボイラ初点火**  
2022年8月1日に計画通り1号ボイラの初点火を実施し、横須賀に頼もしい火を灯すことができました。



**石炭の初受入**  
国際埠頭から石炭船（うしお）が着棧し、屋内式石炭貯蔵建屋へ初めての受入が行われました。

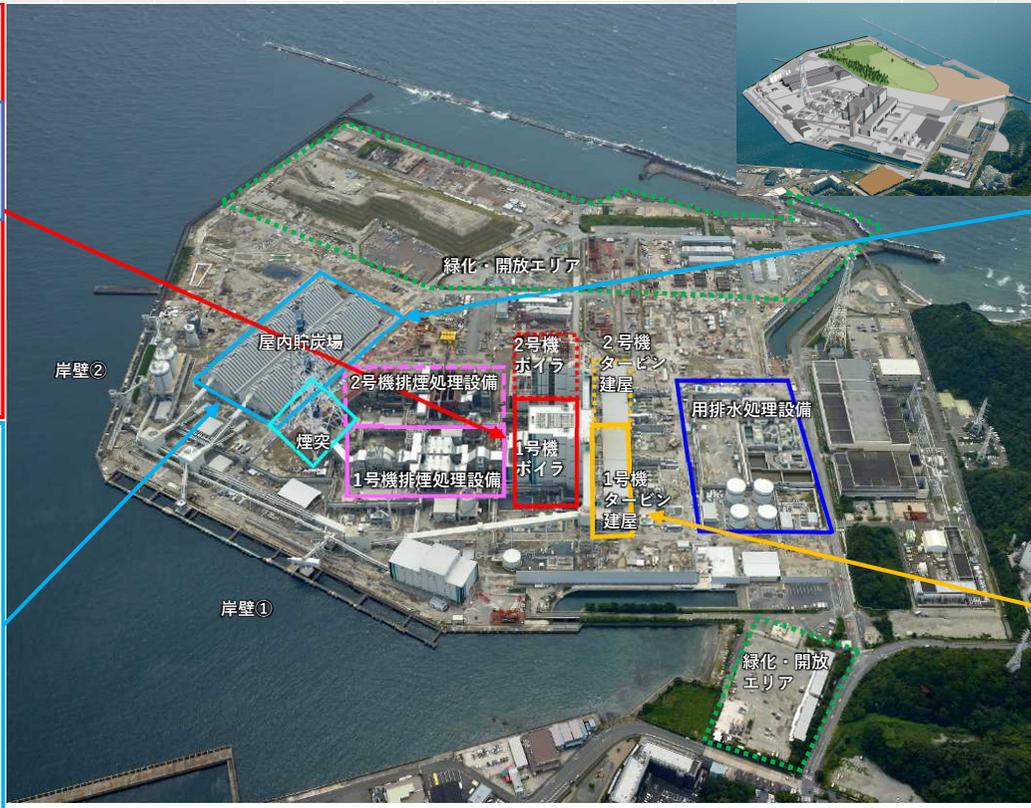

**石炭貯蔵建屋消防検査**  
石炭貯蔵建屋の消防検査を受検し、散水設備・消火設備などが万全であることを確認頂きました。



**補助電源の供給確認試験**  
1号機の小型発電設備を試験的に起動し、設備に対して補助的に電気を供給可能であることを確認しました。

**工事概要**

- ボイラ** 2号ボイラの配管に水圧をかけ、水が漏れないことを確認する水圧試験を実施しました。
- タービン** 2号循環水ポンプ（タービンで使用した蒸気を冷却するための設備）の据付を開始しました。
- 電気設備** 2号機の高圧受配電設備（高圧の電気を通すための設備）の安全装置が正常に組み込まれていることを確認しました。
- 共通設備** 石こう処理建屋（硫黄分除去に伴い取り出す石こうを処理する建屋）の消防検査を受検しました。

先月までの実績工事進捗率

- 1号機工事進捗率 97.0%
- 2号機工事進捗率 66.9%
- 総合工事進捗率 85.2%
