

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度							
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1				
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始							
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				営業運転開始▼			
2号機				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼															



2号ボイラ消防検査


2号ボイラ内で潤滑油の使用を開始するにあたり、消防設備が万全であることを確認して、横須賀市消防局に許可いただきました。



石炭の山

石炭貯蔵建屋

船から受け入れた石炭は、風による飛散防止と、天候の影響を受けないように建物の中に保管しています。保管している石炭の山の高さは約18mになります。

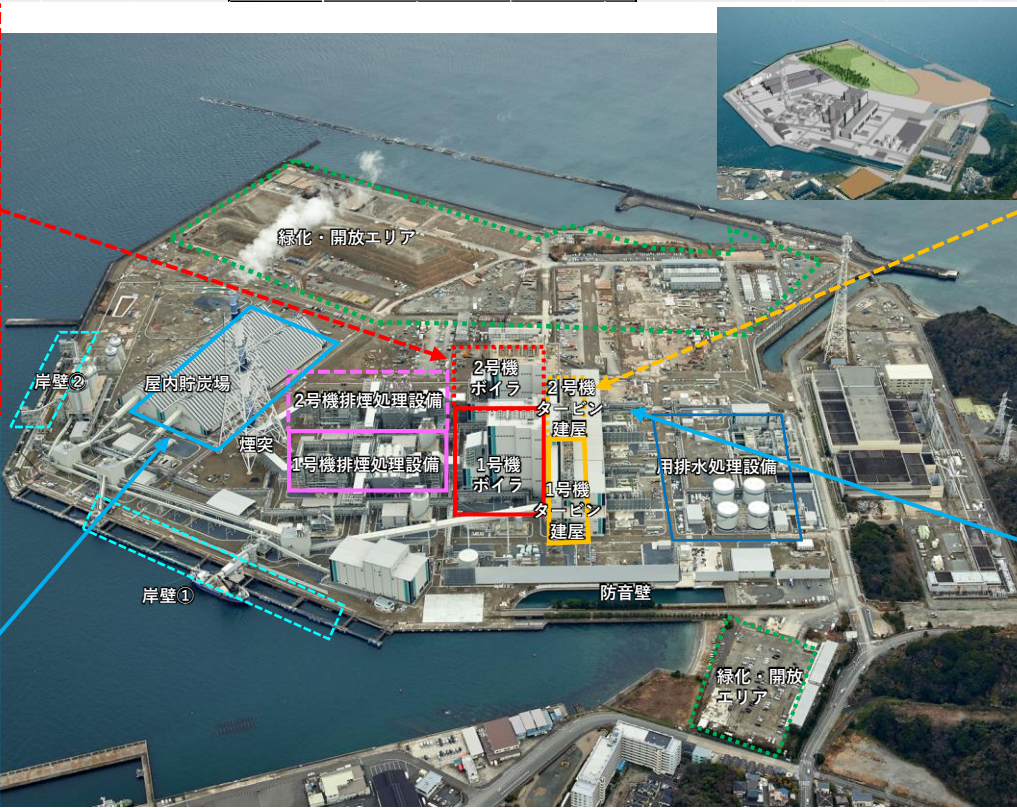

※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



給水関係モータ試運転

ボイラへ水を送るポンプのモータが正常に回転することを確認しました。金属の棒を耳に当てて異音がないかを確認しています。



2号海水スクリーン試運転

海水中に含まれるゴミを取り除く大型スクリーンの試運転を行いました。取り込んだ海水はタービンで仕事を終えた蒸気の冷却に使用されます。

工事概要

- ボイラ** 2号ボイラ内に付着する石炭灰を落とすデスラッタ（煤吹き装置）の動きについて確認しました。
- タービン** 2号のボイラ給水の水质を制御する薬液ポンプの試運転を行いました。
- 電気設備** 2号機のボイラーやタービンへ補助的に電気を供給する小型発電設備が漏電しないことを確認しました。
- 共通設備** 1号機と2号機相互に蒸気を供給しあう配管へ試験的に蒸気を送り内部を綺麗にしました。

先月までの実績工事進捗率

- 1号機工事進捗率 98.7%
- 2号機工事進捗率 85.7%
- 総合工事進捗率 93.6%
