

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼											


※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



岸壁 作業通路整備工事
石炭運搬船などが離着岸する岸壁の通路を平らにする工事が完了しました。通路の段差をなくしたことで、船の離着岸時の作業が安全に実施できます。



2号消火栓設備の放水試験
万一の火災に備えて設置している消火栓設備が正常に使用可能であることを確認して、横須賀市消防局に使用許可をいただきました。

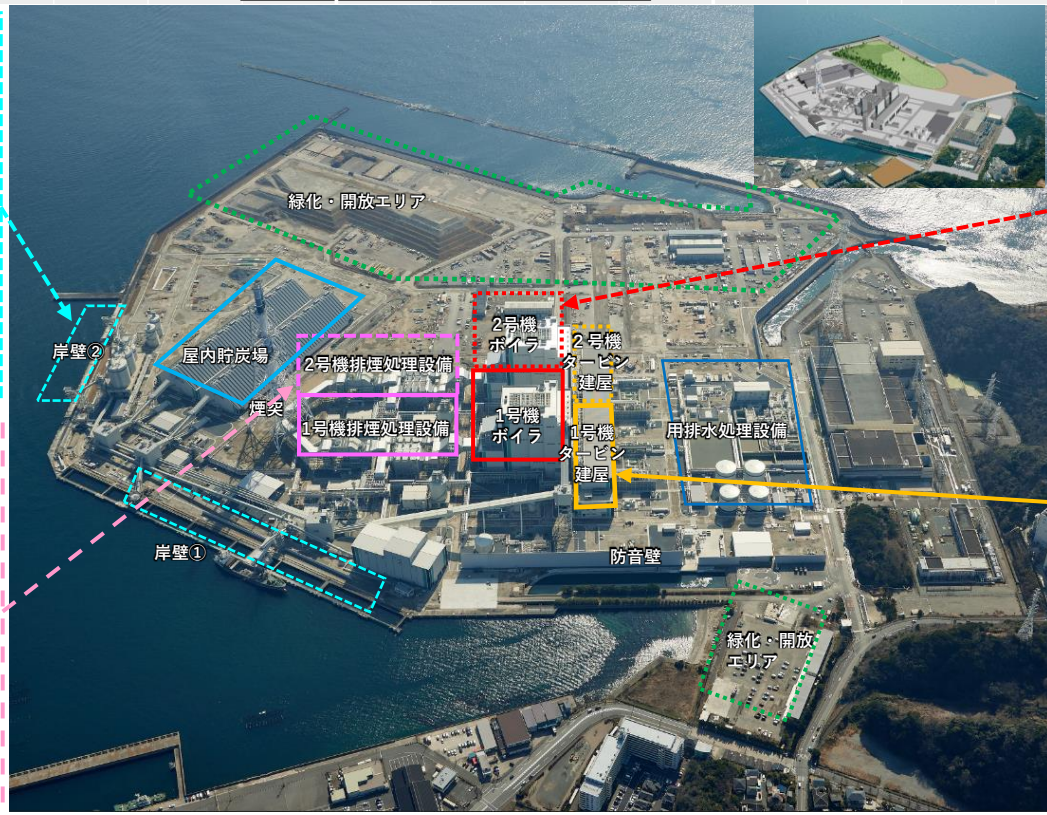

2号微粉炭機の試運転
石炭を細かく粉砕する装置（微粉炭機）の試運転を行いました。粉砕された石炭がボイラ内で燃焼します。



1号機試運転状況
電力消費が多い1,2月は、可能な限りの発電を行いました。

工事概要

- ボイラ** 2号ボイラ内へ石炭燃焼用空気を送るファンの試運転を行いました。
- タービン** 2号の海水が通る配管に漏れがない事を確認しました。海水はさまざまな設備の冷却のために使われます。
- 電気設備** 2号発電機運転に先立ち、冷却用ガスを注入する前に代替ガスを充てんし漏れがない事を確認しました。
- 共通設備** 2号排水処理設備が完成しました。環境を守るために重要で不可欠な設備です。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	99.0%
2号機工事進捗率	89.4%
総合工事進捗率	95.2%
