

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機															
								100m▼ 180m▼ 据付完了▼											
				煙突															

※開放エリア：2025年度中に利用開始予定




### 2号ボイラ 初点火

2号ボイラの初点火を実施しました。これから2号発電設備の試運転が本格的に始まっていきます。



### 石こう搬送コンベア試運転

石こう搬送コンベアの試運転を行いました。燃焼ガス中の硫黄分を除去する過程で副生物として生成される石こうは、このコンベアを用いて船舶に積み込み、セメント原料や土壌改良剤として有効活用するため運び出します。

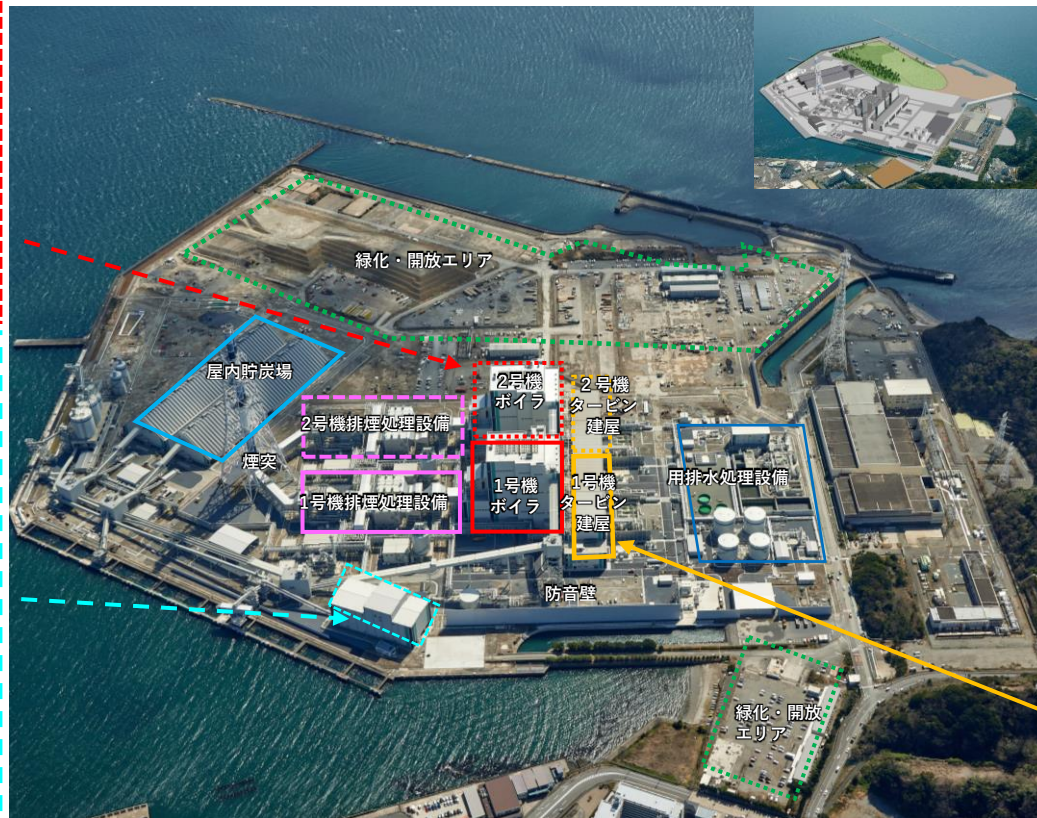

### 執務室引っ越し

1号営業運転開始まで残り2ヶ月を切りました。私たちの執務室も新しい建物の中へ引っ越しました。



### 石炭輸送船『しらなみ』就航

『うしお』に続く2船目の石炭輸送船となる『しらなみ』の命名式が大分県の造船所で行われ、就航しました。GW明けに横須賀火力発電所に到着する予定です。

### 来月の予定

#### < 1号機 >

燃料となる石炭は海外から輸入しますが、産地によって性質が異なります。安定して確保・運用が出来るように、異なる産地の石炭を使って試運転を行い、6月下旬の営業運転開始に向けて最終調整を行っています。

#### < 2号機 >

5月下旬には、初めてボイラによって作られた蒸気がタービンへ送られ、いよいよ発電を開始します。

### 先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	99.5%
2号機工事進捗率	97.2%
総合工事進捗率	98.6%
