

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機				100m▼ 180m▼ 据付完了▼											
				煙突												※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			




1号機 営業運転開始

1号機はすべての工事・試験が完了しました。7月より節電要請が出ている電力逼迫に貢献するため、6月30日より営業運転を開始しました。



2号機 最大発電量到達

1号機に引き続き、2号機も定格電力65万kWに到達しました。これから本格的に各種調整・試験を実施します。

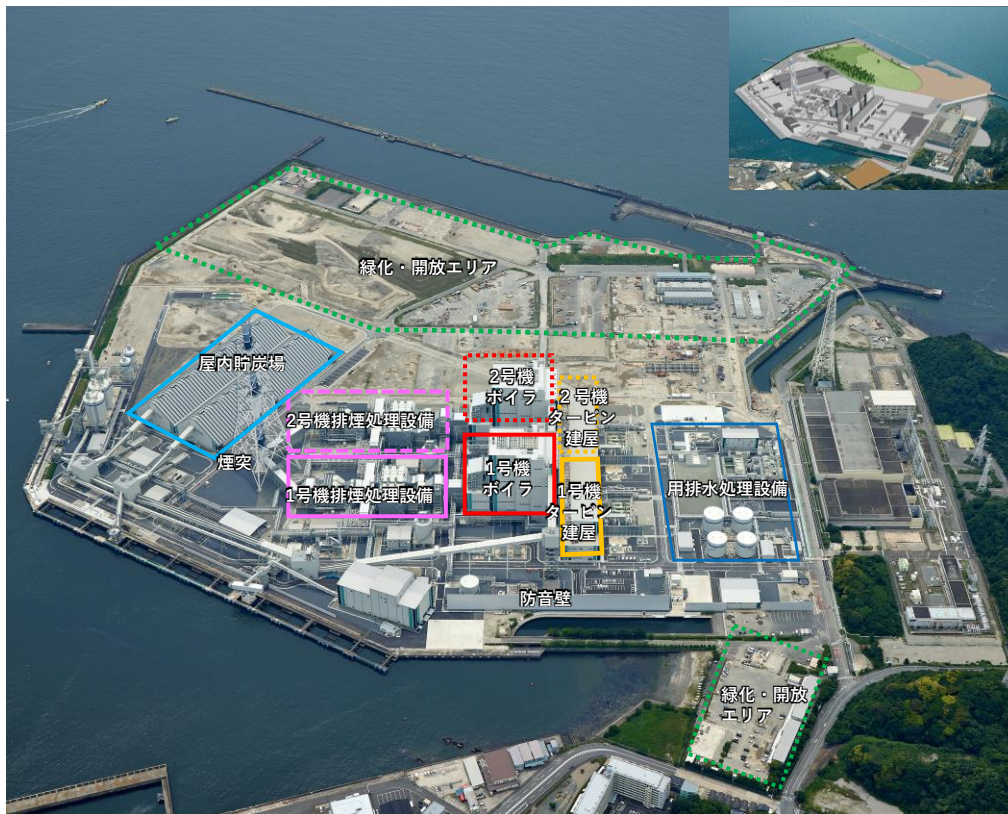

緑化・開放エリア 測量開始
地域のみなさまが楽しめる緑化・開放エリアの建設を計画しています。それにあたり、土地の測量を開始しました。



サイバーセキュリティ講演会
神奈川県警によるサイバーセキュリティの講習会を受講しました。引き続き、発電所のセキュリティ強化に努めていきます。

来月の予定

<2号機>

2号機試運転により発電機が停止している期間を利用し、プラントの安定運転のために、ボイラ設備の内部の点検・手入れを実施します。タービンに送る蒸気から建設中に入り込んだゴミや塵を取り除き、キレイにします。

<緑化・開放エリア>

発電設備の資機材を順次片付けて準備を進め、運営方法を検討しながら建設を行っていきます。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率 **100%**
2号機工事進捗率 **97.9%**
総合工事進捗率 **99.2%**
