



2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼								※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			



1号機営業運転開始から約1ヶ月経過！
6月30日より営業運転を開始してから1ヶ月程が経過し、現在も安定して運転を継続しております。今夏における電力需給ひっ迫の回避に向け、これからも貢献していきます。



協会の事務所新設工事
発電所で働く協会の方々が利用する2階建ての事務所を建設中です。

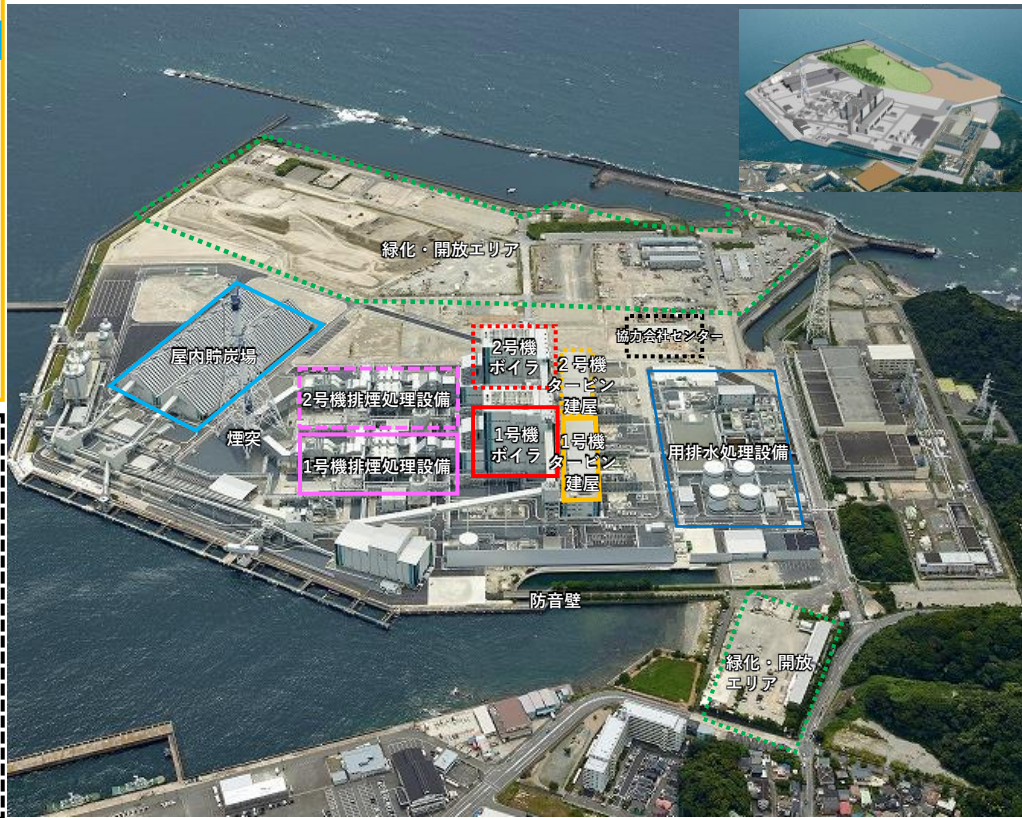

開放エリア 盛替え作業
建設工事で発生した土を開放エリアの建設に有効活用するため、土の盛替え作業を行っています。



放水訓練を実施しました！
万が一の火災に備え、消防隊メンバーによる放水訓練を実施しました。非常時の備えも整えています。

来月の予定
<2号機>
 運転開始後、太陽光や風力などの再生エネ由来の電力に合わせ電力の需給バランスを調整するため、負荷変化試験を実施し、発電設備が所定の出力を安定して出すことができるか確認します。
<緑化・開放エリア>
 皆様に心から楽しんで頂けるよう、横須賀市と協議を重ね、開放エリアの設計を進めていきます。また、並行して設計内容を詳細に決める為、引き続き測量作業・現地調査を行っています。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	100%
2号機工事進捗率	98.2%
総合工事進捗率	99.3%
