



2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機								100m▼ 180m▼ 据付完了▼											
				煙突												※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			

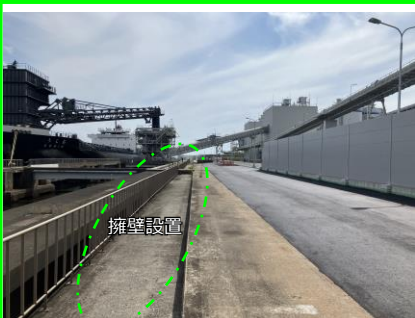

**高波対策工事 開始**  
高波で海水が発電所内に侵入しないよう、コンクリート製の防波堤を建設します。

『しらなみ』『うしお』同時着船  
1号営業運転および2号本格試運転していることから、石炭輸送船2隻が同時に着船することもあります。

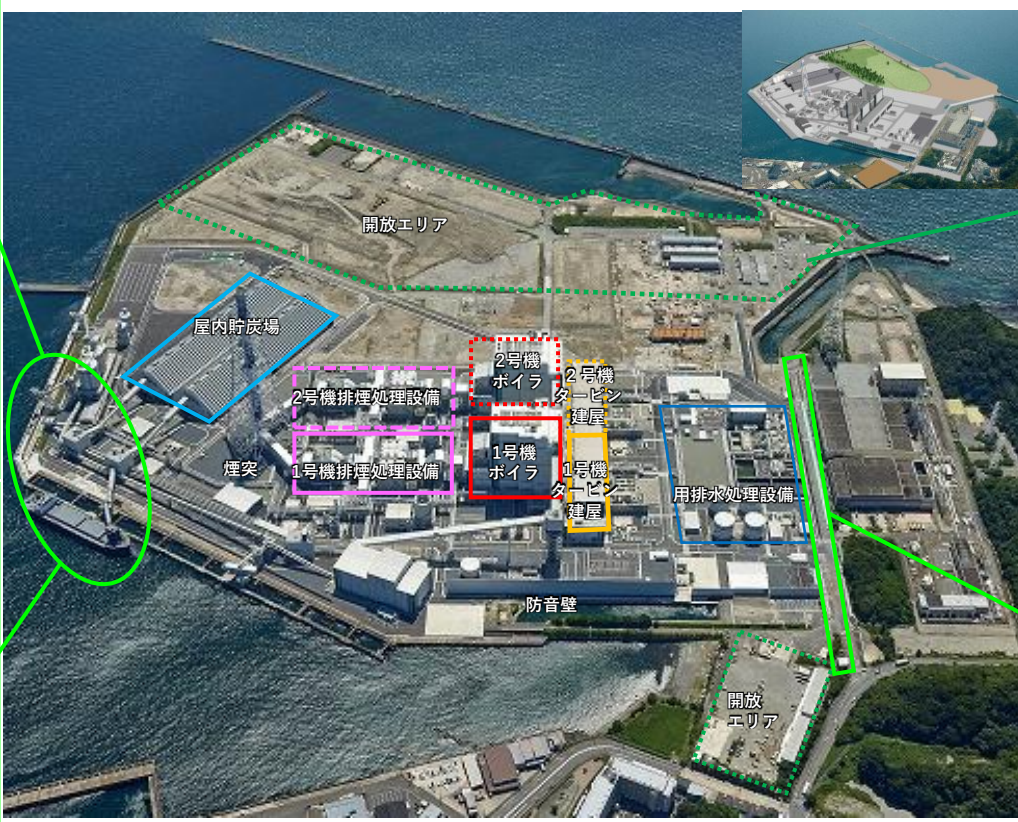

**開放エリア 造成中**  
丘のように高く広がった山ができてきました。こちらの盛土状況を踏まえ、横須賀市役所のみなさまにも現地を視察していただいております。



**ふれあい通り歩道・自転車道完成**  
発電所入口～開放エリアを結ぶ道路に歩道と自転車道の色分けをしました。地域のみなさまが利用される通路となります。

**来月の予定**  
＜2号機＞  
燃料となる石炭を異なる産地のものにて試運転を行い、12月下旬の工事完了に向けて最終調整を行っていきます。  
＜開放エリア＞  
大海原、大自然をバックグラウンドとした美しいランドスケープにするべく、開放エリアに植樹する樹木の設計を進めています。樹木を生産している農園を視察し、より魅力的な空間づくりに努めていきます。

**先月までの実績工事進捗率**

1号機工事進捗率	<b>100%</b>
2号機工事進捗率	<b>98.5%</b>
総合工事進捗率	<b>99.4%</b>
